

杭州锐合精密五金有限公司




企业 AI 高价值场景排序报告

AI SCENARIO PRIORITY REPORT



企业经营现状

PROFILE · PAIN · SYSTEMS



场景匹配与四维评分

MATCH · SCORE · RANK

No.1 报价自动生成 88.5

No.2 订单交付预警 81.5

No.3 经营日报与指... 74.5

先做哪一个

PRIORITY · ROADMAP

先做这一个 · START HERE

报价自动生成

销售前端 环节 · 给销售内勤与报价工程师用 · 替代逐单查历史价、问成本、做报价单的重复劳动。预期报价响应从 2 天缩短到 4 小时内。

AI获客

4 周上线

轻投入 · 1-5 万元

综合 88.5 分



88.5
首选场景得分
共 13 个候选

候选场景

13 个

制造业场景库

所选痛点

5 项

严重度合计 19

数据就绪

69%

数据条件部分具备

起步投入

5-20 万元

流程级应用

首批见效

4 周

上线周期

00

本报告导航

HOW TO READ

28

页

阅读指引

READING GUIDE

- 第 01 章是结论：先做哪一个场景、接下来做哪两个、哪些先放进储备。只看这一章也能开工。
- 第 02 至 04 章说明这个排序是怎么算出来的：您的痛点画像、场景筛选过程、四维评分明细。
- 第 05 至 08 章逐个展开前三个场景的落地方案，每个场景一页纸即可交给负责人。
- 第 09 至 12 章是条件与节奏：数据补齐清单、12 个月排期、投入区间、风险与前置条件。
- 附录列出本行业全部候选场景的评分与未入选原因，供后续复盘时回看。

本次评分口径

SCORING BASIS

四维权重 · 标准权重

总分 = 痛点强度 × 0.35 + 数据可得 × 0.30 + 见效周期 × 0.20 + (6 - 实施门槛) × 0.15

痛点强度 35%

数据可得 30%

见效周期 20%

实施门槛 15%

实施门槛计时取（6 - 门槛），门槛越低得分越高。

场景库全量

182 个

14 个行业大类

本行业候选

13 个

制造业

进入排序表

8 个

按四维总分

章节索引

CONTENTS

章	标题	一句话内容	页
本报告导航	本报告导航	阅读指引、章节索引与本次评分口径	2
01	排序结论速览	六个问题、六句回答与总体判断	3
02	企业画像与现状	基本情况、现状条件、行业视角与场景库覆盖	5
03	痛点画像	所选痛点的分布、严重程度与对应场景	6
04	评分方法	四维定义、权重与 1-5 分含义	8
05	场景排序总表	前 8 个场景的四维得分、排名与理由	10
06	价值与门槛	四象限定位与前三个场景四维对比	12
07	第 1 场景 · 报价自动生成	前五个场景逐个展开：做法、数据、指标与前置条件	13
12	数据就绪度	场景与数据源的对应关系与缺口	18
13	12 个月排期	三批次排期、里程碑与交付物	20
14	投入与回报	投入档位、逐场景区间与收益折算口径	21
15	风险与前置条件	风险提示、前置条件与角色分工	23
16	90 天启动清单	可勾选执行项、负责人与验收	24
17	未入选与复盘	本轮暂不启动的场景与何时重跑	25
附录	A 评分明细	全部候选场景四维原始分与加权贡献	26
附录	B 方法与来源	术语、计分口径、信息来源与置信度	27

01

排序结论速览

EXECUTIVE SUMMARY

88.5

首选场景综合得分

先做哪一个？

报价自动生成

销售前端环节，给销售内勤与报价工程师用，替代逐单查历史价、问成本、做报价单的重复劳动。

为什么是它？

88.5 分 · 四维均衡

痛点强度 4、数据可得 5、见效周期 5、实施门槛 2.5（计分取反）。命中所选痛点「报价慢」「成本不清」，严重度合计 7 / 10。

数据够不够？

数据条件部分具备 69%

补齐「MES / 生产系统」可解锁 3 个场景；首选场景所需数据现在就能拿到。

多久见效？

4 周上线

报价响应从 2 天缩短到 4 小时内。第一步：整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板。

投多少？

流程级应用 · 5-20 万元

场景嵌入日常作业流程，打通一到两个业务系统的取数。

接下来做什么？

订单交付预警 · 经营日报与指标归因

第 4-8 个月并行推进，两个场景的改善出现在经营报表上，形成可复制的推进方式。

总体判断 · VERDICT

先做「报价自动生成」，4 周上线，投入 1-5 万元，对应 AI 获客模块

排在前列：正面命中「报价慢」「成本不清」，数据可得 5 / 5，见效 5 / 5，门槛 2.5 / 5。

候选场景

13 个

制造业场景库

命中所选痛点

5 个

与 5 项痛点有交集

数据条件具备

10 个

关键数据源现在可取

首批启动

1 个

第 1-3 个月

12 个月覆盖

5 个

三批次合计


01

三步走与前三个场景

ROADMAP AT A GLANCE

5

个场景 · 12 个月

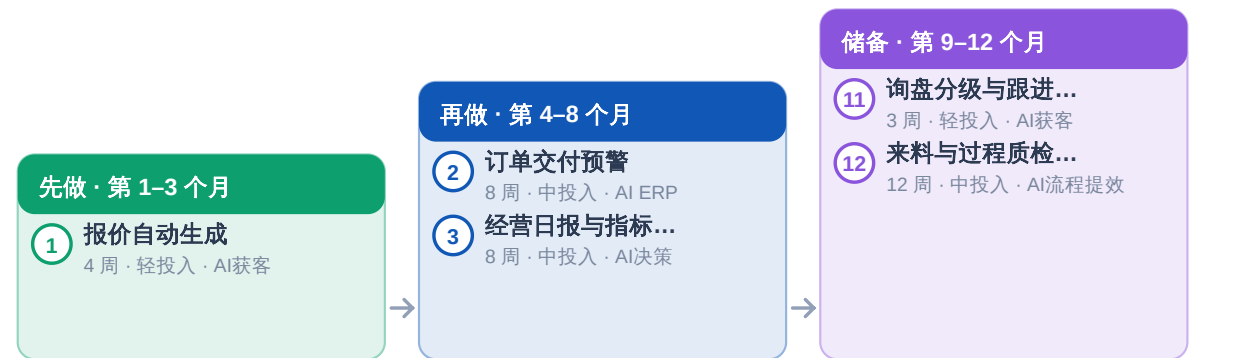

第一个场景稳定运行，做法与数据口径... 两个场景的改善出现在经营报表上，形... 条件补齐的场景进入评估，AI 覆盖...

前三个场景

TOP 3 SCENARIOS

No.1 报价自动生成

销售前端 · 销售内勤与报价工程师

项目	内容
替代	逐单查历史价、问成本、做报价单...
预期	报价响应从 2 天缩短到 4 小时内
第一步	整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板
模块	AI 获客 4 周 · 轻投入

综合 88.5 分 (痛 4 数 5 效 5 槛 2.5)

No.2 订单交付预警

生产计划 · 生产计划员与业务经理

项目	内容
替代	每天上午手工核对交期的两小时
预期	交期达成率提升 8-12 个百分点
第一步	导出近 6 个月订单与实际交付日期，做一次准点率基线
模块	AI ERP 8 周 · 中投入

综合 81.5 分 (痛 4 数 5 效 4 槛 3.5)

No.3 经营日报与指标归因

经营管理 · 总经理与各部门负责人

项目	内容
替代	经营会前各部门先对数的半天
预期	经营数据从月度口径变为每日可查
第一步	定下 8 个经营指标的口径与取数位置，先做成一页日报
模块	AI 决策 8 周 · 中投入

综合 74.5 分 (痛 3 数 5 效 4 槛 3.5)

下一步 · NEXT

第一步就是这一件事

第一步：整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板。同时评估补齐「MES / 生产系统」，它关系到 3 个场景。

02

企业画像与现状
COMPANY PROFILE

7
项画像标签

杭州锐合精密五金有限公司是一家位于浙江的机械与五金企业，民营企业，成立 10 年以上，101–300 人，上年营收 2000 万–1 亿，主要面向企业客户。现有系统：ERP、财务软件，数字化专职人员 1–2 人。

制造业 · 机械与五金 101–300 人 2000 万–1 亿 民营企业 企业客户 已有 ERP / 财务软件 数字化专职 1–2 人

现状与目标

CURRENT STATE

问题	本次作答	对排序的影响
数据现在放在哪	大部分在业务系统里	数据可得分不调整
接下来半年最想改善	提效率	同分场景优先排与该目标相关的
希望多久看见结果	6 个月内	见效周期分不调整
能投入的人	现有人员兼职推进	实施门槛分调整 +0.5 分

现有业务系统

SYSTEMS IN PLACE

ERP 已有

本行业 6 个场景需要

财务软件 已有

本行业 3 个场景需要

CRM 暂无

本行业 1 个场景需要

OA / 协同办公 暂无

本行业场景暂不依赖

MES / 生产系统 暂无

本行业 3 个场景需要

电商 / 门店系统 暂无

本行业场景暂不依赖

人事系统 暂无

本行业场景暂不依赖

行业视角 · 制造业

SECTOR VIEW

制造企业的 AI 价值集中在交付、质量与成本三条线：订单交期预警、排产优化、来料与过程质检、设备预测性维护、报价自动化。多数中小制造企业已有 ERP 但缺 MES，车间数据靠人工回填，这是 AI 落地前最常见的数据断点。

本行业常见的三个切入点

ENTRY POINTS

- 切入点 1 订单交付预警与智能排产
- 切入点 2 质检与设备预测维护
- 切入点 3 报价与售后知识库

数据现状 · DATA STATE


大部分在业务系统里

数据条件较好，可直接进入系统内取数 本行业 13 个候选场景中，3 个无需接入业务系统。

03

痛点画像
PAIN PROFILE

5
项 / 共 16 项候选

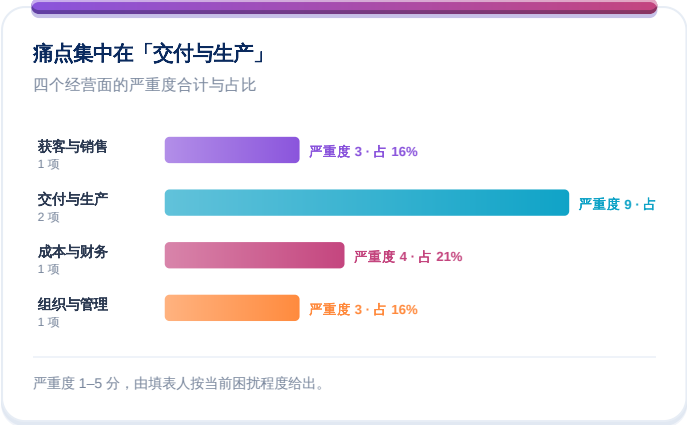

读法 · HOW TO READ

所选 5 项痛点集中在「交付与生产」（2 项，严重度合计 9），其次是「成本与财务」（1 项）。严重度最高的是「交期常被客户催，能不能按时交货说不准」。

痛点与场景的逐项对应

PAIN TO SCENARIO

所选痛点	严重度	对应场景	最高排名
交期 交期常被客户催，能不能按时交货说不准	5	订单交付预警、智能排产与插单模拟	第 2 名
插单排产 插单一来整个排产就乱，靠车间主任凭经验调	4	智能排产与插单模拟	第 4 名
成本不清 单件成本算不准，报价靠毛估，做完才知道赚多少	4	报价自动生成、单件成本还原与毛利看板	第 1 名
报价慢 客户询价后报价要等两三天，单子被同行先接走	3	报价自动生成	第 1 名
加班 关键岗位天天加班，人一休假事情就停	3	订单交付预警、经营日报与指标归因	第 2 名

03

痛点与场景的对应

PAIN TO SCENARIO

16

项候选痛点

痛点如何变成场景

左：勾选的痛点分组 中：匹配到的场景与得分 右：对应的薯片AI智能体模块



连线粗细表示该场景的综合得分；一个场景可同时对应多个痛点分组。

本行业候选痛点全表

制造业 · 16 ITEMS

获客与销售	本次
报价慢 客户询价后报价要等两三天，单子被同...	严重度 3
客户集中 订单集中在几个老客户身上，新客户进...	—
询盘流失 展会与平台来的询盘散在微信和邮箱里...	—
售后响应 客户问参数、问配件，要翻图纸再找老...	—

成本与财务	本次
成本不清 单件成本算不准，报价靠毛估，做完才...	严重度 4
库存积压 原材料与半成品积压，账上有货车间找...	—
应收拖期 应收账款拖期，催款靠业务员想起来才...	—
能耗不明 水电气与辅料消耗只有总数，分不到产...	—

交付与生产	本次
交期 交期常被客户催，能不能按时交货说不准	严重度 5
插单排产 插单一来整个排产就乱，靠车间主任凭...	严重度 4
质量追溯 来料与过程质检靠人眼，批量问题事后...	—
设备停机 设备故障停机没有预兆，停一次影响一...	—

组织与管理	本次
加班 关键岗位天天加班，人一体假事情就停	严重度 3
经验流失 老师傅的工艺经验在脑子里，人走了就...	—
报表口径 各部门报表口径不一，经营会上先对数...	—
新人上手 一线与技术岗招人难，新人上手要三个月	—

04

评分方法
SCORING METHOD

标准权重
本次权重

总分 = 四维加权，换算为百分制

总分 = 痛点强度 × 0.35 + 数据可得 × 0.30 + 见效周期 × 0.20 + (6 - 实施门槛) × 0.15

痛点强度 35% 数据可得 30% 见效周期 20% 实施门槛 15%

权重可在排序台现场调整，调整后按和为 1 归一化并立即重排。

痛点强度 35%

这个场景解决的是否正是您勾选的痛点

场景的痛点标签与您勾选的痛点求交集，按您给出的严重程度加权，映射到 1-5 分

数据可得 30%

落地这个场景所需的数据，现在拿不拿得到

场景的数据依赖与您现有的业务系统比对，再按数据存放现状调整；关键系统缺失时计 1 分

见效周期 20%

从开始做到看见结果需要多久

取场景预设的见效速度，再按您期望的见效窗口调整

实施门槛 15%

落地要动多少流程、系统与人

取场景预设的实施门槛，再按您可投入的人力调整；计时用时（6 - 门槛），门槛越低得分越高

1-5 分的含义

SCALE DEFINITION

维度	1 分	2 分	3 分	4 分	5 分
痛点强度	未命中所选痛点	轻微相关	命中一项	命中且严重程度较高	正面命中所选重点痛点
数据可得	关键数据源缺失	数据分散需要整理	部分数据可得	主要数据可得	所需数据均已具备
见效周期	一年以上	半年以上	三到六个月	一到三个月	一个月内可见
实施门槛	当天可起步	一周内可起步	需要跨部门配合	需要改造流程或系统	需要系统改造与外部配合

口径说明 · CONFIDENCE

两维来自本次作答，两维为经验估算

四维评分中，痛点强度与数据可得来自本次作答，随企业实际情况变化；见效周期与实施门槛为场景库预设值，属经验估算。

04

从场景库到排序表

SELECTION FUNNEL

182

个场景全量

从 182 个场景到 1 个起步动作

每一层的筛选依据写在右侧



本次筛选的关键动作

KEY FILTERS

- 按行业大类取库，贵司属制造业，取该大类 13 个场景作为候选，不跨行业混排。
- 按勾选痛点计强度，5 个场景与所选痛点有交集，其余按 1 分计入，仍参与排序。
- 按现有系统统计数据可得，10 个场景的关键数据源现在就能拿到，其余计 1 分。
- 按四维总分取前 8 个，再从中挑出数据条件具备、门槛可控的一个作为首批启动。

差异化 · WHY IT CHANGES

换一组现有系统，排序就会变

数据可得占 30% 权重，关键数据源缺失直接计 1 分。补齐一个数据源，相关场景排名会明显上移。

05

场景排序总表
RANKING

8
个进入排序 / 共 13 个

排名	场景	痛点	数据	见效	门槛	总分	对应模块
1	报价自动生成 销售前端 · 销售内勤与报价工程师	4	5	5	2.5	88.5	AI获客
2	订单交付预警 生产计划 · 生产计划员与业务经理	4	5	4	3.5	81.5	AI ERP
3	经营日报与指标归因 经营管理 · 总经理与各部门负责人	3	5	4	3.5	74.5	AI决策
4	智能排产与插单模拟 生产计划 · 车间主任与计划员	5	4	3	5	74.0	AI ERP
5	售后与技术支持知识库 售后服务 · 售后工程师与客服	1	5	5	1.5	70.5	AI流程提效
6	单件成本还原与毛利看板 成本核算 · 财务经理与总经理	3	5	3	4.5	67.5	AI CFO
7	应收账款预警与催收提醒 财务管理 · 财务与业务经理	1	5	5	2.5	67.5	AI CFO
8	工艺经验沉淀与新人带教 人员培养 · 工艺工程师与班组长	1	5	4	2.5	63.5	AI人力官

为什么排这里

RATIONALE

- 1

报价自动生成 (88.5 分)
排在前列：正面命中「报价慢」「成本不清」，数据可得 5 / 5，见效 5 / 5，门槛 2.5 / 5。
- 2

订单交付预警 (81.5 分)
排在前列：正面命中「交期」「加班」，数据可得 5 / 5，见效 4 / 5，门槛 3.5 / 5。
- 3

经营日报与指标归因 (74.5 分)
排在前列：正面命中「加班」，数据可得 5 / 5，见效 4 / 5，门槛 3.5 / 5。
- 4

智能排产与插单模拟 (74.0 分)
进入候选：正面命中「插单排产」「交期」，数据可得 4 / 5，见效 3 / 5，门槛 5 / 5。
- 5


售后与技术支持知识库 (70.5 分)
进入候选：与所选痛点关联较弱，数据可得 5 / 5，见效 5 / 5，门槛 1.5 / 5。

05

得分构成与全部候选

SCORE COMPOSITION

13
个候选场景

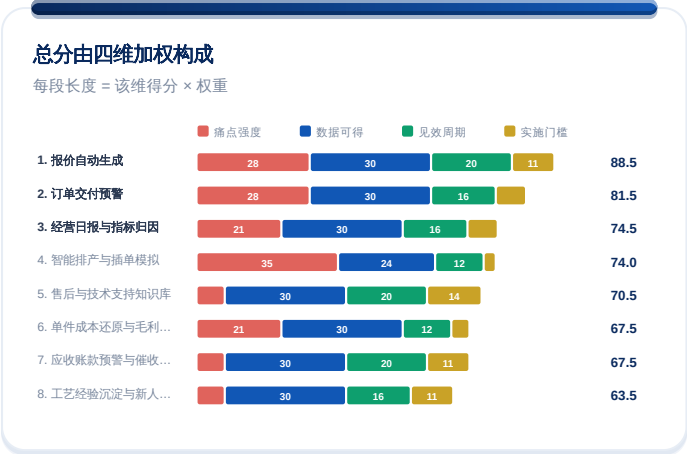

全部 13 个候选场景

ALL CANDIDATES

排名	场景	环节	痛	数	效	槛	总分	状态
1	报价自动生成	销售前端	4	5	5	2.5	88.5	进入排序
2	订单交付预警	生产计划	4	5	4	3.5	81.5	进入排序
3	经营日报与指标归因	经营管理	3	5	4	3.5	74.5	进入排序
4	智能排产与插单模拟	生产计划	5	4	3	5	74.0	进入排序
5	售后与技术支持知识库	售后服务	1	5	5	1.5	70.5	进入排序
6	单件成本还原与毛利看板	成本核算	3	5	3	4.5	67.5	进入排序
7	应收账款预警与催收提醒	财务管理	1	5	5	2.5	67.5	进入排序
8	工艺经验沉淀与新人带教	人员培养	1	5	4	2.5	63.5	进入排序
9	库存与安全库存预警	仓储物料	1	5	4	3.5	60.5	本轮暂缓
10	能耗与班次消耗分析	成本管理	1	5	3	4.5	53.5	本轮暂缓
11	询盘分级与跟进提醒	销售前端	1	1	5	2.5	43.5	需补数据
12	来料与过程质检辅助	质量管理	1	1	3	4.5	29.5	需补数据
13	设备预测性维护	设备管理	1	1	2	5	24.0	需补数据

四象限定位

横轴实施门槛，纵轴业务价值，气泡大小为投入档



虚线圈表示关键数据源缺失，补齐后再看位置。


四象限怎么读

HOW TO READ

- 左上「先做」：价值高、门槛低，是首批启动的来源。
- 右上「规划」：价值高但要改流程或系统，适合在首批跑通后启动。
- 左下「顺带」：门槛低、见效快，可在主线推进的同时让更多岗位先用起来。
- 右下「暂缓」：本轮不投入精力，等条件变化后重新评估。

前三个场景四维对比

四角越靠外越有利（门槛已取反）

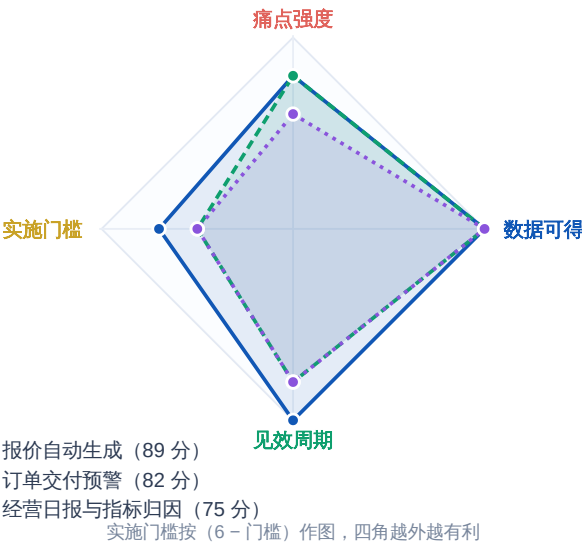

场景	强在哪	弱在哪	总分
1. 报价自动生成	数据可得 所需数据源均已具备：ERP。	实施门槛 场景库预设门槛 2 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分。	88.5
2. 订单交付预警	数据可得 所需数据源均已具备：ERP。	实施门槛 场景库预设门槛 3 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分。	81.5
3. 经营日报与指标归因	数据可得 所需数据源均已具备：ERP、财务软件。	实施门槛 场景库预设门槛 3 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分。	74.5

1

报价自动生成

销售前端 · 销售内勤与报价工程师

88.5
综合得分 · 排名第 1

对应模块
AI获客
轻享版可开通

上线周期
4 周
含数据整理与试运行

投入档
轻
1-5 万元

数据条件
已具备
ERP

这件事具体是什么

WHAT IT DOES

项目	内容
替代什么	逐单查历史价、问成本、做报价单的重复劳动
给谁用	销售内勤与报价工程师
预期指标	报价响应从 2 天缩短到 4 小时内
收益折算	按报价响应提速带来的成单率提升折算
前置条件	材料价格表需要有人定期维护

落地三步

THREE STEPS

- 1 第一步 整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板
- 2 补齐前置 材料价格表需要有人定期维护
- 3 在 AI获客 中配置并试运行两周
由销售内勤与报价工程师使用，记录使用前后的对比：报价响应从 2 天缩短到 4 小时内。

四维逐项依据

SCORE BREAKDOWN

维度	得分	依据
痛点强度	4	命中所选痛点「报价慢」「成本不清」，严重度合计 7 / 10
数据可得	5	所需数据源均已具备：ERP
见效周期	5	场景库预设见效速度 5 / 5，上线约 4 周
实施门槛	2.5	场景库预设门槛 2 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分

所需数据清单

DATA REQUIRED

#	数据	来源
1	历史报价与成交记录	ERP
2	材料价格表	ERP
3	工时与费率标准	ERP

为什么排在第 1 位 · RATIONALE

排在前列：正面命中「报价慢」「成本不清」，数据可得 5 / 5，见效 5 / 5，门槛 2.5 / 5。

2

订单交付预警

生产计划 · 生产计划员与业务经理

81.5
综合得分 · 排名第 2

对应模块

AI ERP

轻享版可开通

上线周期

8 周

含数据整理与试运行

投入档

中

5-20 万元

数据条件

已具备

ERP

这件事具体是什么

WHAT IT DOES

项目	内容
替代什么	每天上午手工核对交期的两小时
给谁用	生产计划员与业务经理
预期指标	交期达成率提升 8-12 个百分点
收益折算	按延期订单减少与催单沟通工时折算
前置条件	工序进度需要每日回填，纸质流转卡先做电子化

落地三步

THREE STEPS

- 1 第一步 导出近 6 个月订单与实际交付日期，做一次准点率基线
- 2 补齐前置 工序进度需要每日回填，纸质流转卡先做电子化
- 3 在 AI ERP 中配置并试运行两周
由生产计划员与业务经理使用，记录使用前后的对比：交期达成率提升 8-12 个百分点。

四维逐项依据

SCORE BREAKDOWN

维度	得分	依据
痛点强度	4	命中所选痛点「交期」「加班」，严重度合计 8 / 10
数据可得	5	所需数据源均已具备：ERP
见效周期	4	场景库预设见效速度 4 / 5，上线约 8 周
实施门槛	3.5	场景库预设门槛 3 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分

所需数据清单

DATA REQUIRED

#	数据	来源
1	近 6 个月订单与实际交付日期	ERP
2	在制品工序进度	ERP
3	物料到货计划	ERP

为什么排在第 2 位 · RATIONALE

排在前列：正面命中「交期」「加班」，数据可得 5 / 5，见效 4 / 5，门槛 3.5 / 5。

3

经营日报与指标归因

经营管理 · 总经理与各部门负责人

74.5
综合得分 · 排名第 3

对应模块
AI决策
轻享版可开通

上线周期
8 周
含数据整理与试运行

投入档
中
5-20 万元

数据条件
已具备
ERP、财务软件

这件事具体是什么

WHAT IT DOES

项目	内容
替代什么	经营会前各部门先对数的半天
给谁用	总经理与各部门负责人
预期指标	经营数据从月度口径变为每日可查
收益折算	按管理层决策提前与对数工时下降折算
前置条件	指标口径需要各部门确认一次，存在分歧的先统一定义

落地三步

THREE STEPS

- 1 第一步 定下 8 个经营指标的口径与取数位置，先做成一页日报
- 2 补齐前置 指标口径需要各部门确认一次，存在分歧的先统一定义
- 3 在 AI决策 中配置并试运行两周
由总经理与各部门负责人使用，记录使用前后的对比：经营数据从月度口径变为每日可查。

四维逐项依据

SCORE BREAKDOWN

维度	得分	依据
痛点强度	3	命中所选痛点「加班」，严重程度合计 3 / 10
数据可得	5	所需数据源均已具备：ERP、财务软件
见效周期	4	场景库预设见效速度 4 / 5，上线约 8 周
实施门槛	3.5	场景库预设门槛 3 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分

所需数据清单

DATA REQUIRED

#	数据	来源
1	产量与交付数据	ERP/财务软件
2	收入成本与毛利数据	ERP/财务软件
3	在手订单与产能负荷	ERP/财务软件

为什么排在第 3 位 · RATIONALE

排在前列：正面命中「加班」，数据可得 5 / 5，见效 4 / 5，门槛 3.5 / 5。

4

智能排产与插单模拟

生产计划 · 车间主任与计划员

74.0

综合得分 · 排名第 4

对应模块

AI ERP

轻享版可开通

上线周期

16 周

含数据整理与试运行

投入档

重

20 万元以上

数据条件

已具备

ERP

这件事具体是什么

WHAT IT DOES

项目	内容
替代什么	插单后重排计划的半天返工
给谁用	车间主任与计划员
预期指标	插单响应从半天缩短到 1 小时内
收益折算	按设备利用率提升与加班工时下降折算
前置条件	标准工时需要重新测定，缺失工时的工序先按经验值补齐

落地三步

THREE STEPS

- 1 第一步 整理主力产品的工艺路线与标准工时，先覆盖产值前 20% 的品类
- 2 补齐前置 标准工时需要重新测定，缺失工时的工序先按经验值补齐
- 3 在 AI ERP 中配置并试运行两周
- 由车间主任与计划员使用，记录使用前后的对比：插单响应从半天缩短到 1 小时内。

四维逐项依据

SCORE BREAKDOWN

维度	得分	依据
痛点强度	5	命中所选痛点「插单排产」「交期」，严重度合计 9 / 10
数据可得	4	已有 ERP，仍需补齐 MES / 生产系统
见效周期	3	场景库预设见效速度 3 / 5，上线约 16 周
实施门槛	5	场景库预设门槛 5 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分

所需数据清单

DATA REQUIRED

#	数据	来源
1	工艺路线与标准工时	ERP/MES / 生产系统
2	设备与人员可用产能	ERP/MES / 生产系统
3	在手订单与优先级规则	ERP/MES / 生产系统

为什么排在第 4 位 · RATIONALE

进入候选：正面命中「插单排产」「交期」，数据可得 4 / 5，见效 3 / 5，门槛 5 / 5。

5

售后与技术支持知识库

售后服务 · 售后工程师与客服

70.5

综合得分 · 排名第 5

对应模块

AI流程提效

轻享版可开通

上线周期

2 周

含数据整理与试运行

投入档

零

0 元

数据条件

零依赖

无需接入业务系统

这件事具体是什么

WHAT IT DOES

项目	内容
替代什么	翻图纸、问老师傅的往返确认
给谁用	售后工程师与客服
预期指标	常见技术问题的答复时间缩短到 10 分钟内
收益折算	按售后响应工时下降与客户满意度折算
前置条件	图纸与参数表需要统一版本，过期资料先做清理

落地三步

THREE STEPS

- 1 第一步 收集近一年售后问答记录，整理出高频问题前 50 条
- 2 补齐前置 图纸与参数表需要统一版本，过期资料先做清理
- 3 在 AI流程提效 中配置并试运行两周
- 由售后工程师与客服使用，记录使用前后的对比：常见技术问题的答复时间缩短到 10 分钟内。

四维逐项依据

SCORE BREAKDOWN

维度	得分	依据
痛点强度	1	未命中本次勾选的痛点，该场景对应「售后响应」「经验流失」
数据可得	5	无需接入业务系统，整理现有资料即可起步
见效周期	5	场景库预设见效速度 5 / 5，上线约 2 周
实施门槛	1.5	场景库预设门槛 1 / 5；现有人员兼职推进，调整 +0.5 分

所需数据清单

DATA REQUIRED

#	数据	来源
1	产品图纸与技术参数表	现有资料
2	历史故障与解决记录	现有资料
3	常见问题问答整理	现有资料

为什么排在第 5 位 · RATIONALE

进入候选：与所选痛点关联较弱，数据可得 5 / 5，见效 5 / 5，门槛 1.5 / 5。

12

数据就绪度
DATA READINESS

69%
数据条件部分具备

场景与数据源的对应关系

绿色为需要且已具备，橙色为需要但缺失

	ERP	财务软件	CRM 暂无	OA 暂无	MES 暂无	电商 暂无	人事系统 暂无
1. 报价自动生成	✓						
2. 订单交付预警	✓						
3. 经营日报与指标归因	✓	✓					
4. 智能排产与插单模拟	✓				补		
5. 售后与技术支持知识库							
6. 单件成本还原与毛利...	✓	✓					
7. 应收账款预警与催收...		✓					
8. 工艺经验沉淀与新人...							
9. 库存与安全库存预警	✓						
10. 能耗与班次消耗分析							
11. 询盘分级与跟进提醒			补				
12. 来料与过程质检辅助					补		
13. 设备预测性维护					补		

✓ 需要且已具备

补 需要但缺失

该场景不需要

一行一个场景，一列一个业务系统。整行无色块表示该场景无需接入任何系统。

无需接入系统即可起步

ZERO DEPENDENCY

排名	场景	上线
5	售后与技术支持知识库	2 周
8	工艺经验沉淀与新人带教	5 周
10	能耗与班次消耗分析	12 周

读法 · HOW TO READ

本行业 13 个场景共提出 13 项数据源需求，当前已具备 9 项（69%）。
补齐「MES / 生产系统」可解锁 3 个场景。另有 3 个场景无需接入业务系统，整理现有资料即可起步。

12

补齐清单与解锁关系
GAPS & UNLOCKS

2
项数据源待补齐

补齐哪一个数据源最划算

按解锁场景数排序

需要补齐的数据源

MES / 生产系统
补齐后解锁 3 个场景

CRM
补齐后解锁 1 个场景

因此暂缓的场景

11. 询盘分级与跟进... CRM

12. 来料与过程质检... MES / 生...

13. 设备预测性维护 MES / 生...

解锁指该场景的数据可得分从 1 分回到可评估区间。

补齐清单

GAP LIST

缺失数据源	解锁	最高排名
MES / 生产系统	3 个	第 4 名
CRM	1 个	第 11 名

测算 · IMPACT

补齐「MES / 生产系统」

该数据源关系到 3 个场景，其中排名最高的是第 4 名。补齐后建议重新跑一次排序。

受影响的场景


BLOCKED SCENARIOS

排名	场景	缺什么	对应模块
11	询盘分级与跟进提醒	CRM	AI获客
12	来料与过程质检辅助	MES / 生产系统	AI流程提效
13	设备预测性维护	MES / 生产系统	AI ERP

13

12 个月排期
ROADMAP

5
个场景 · 三批次

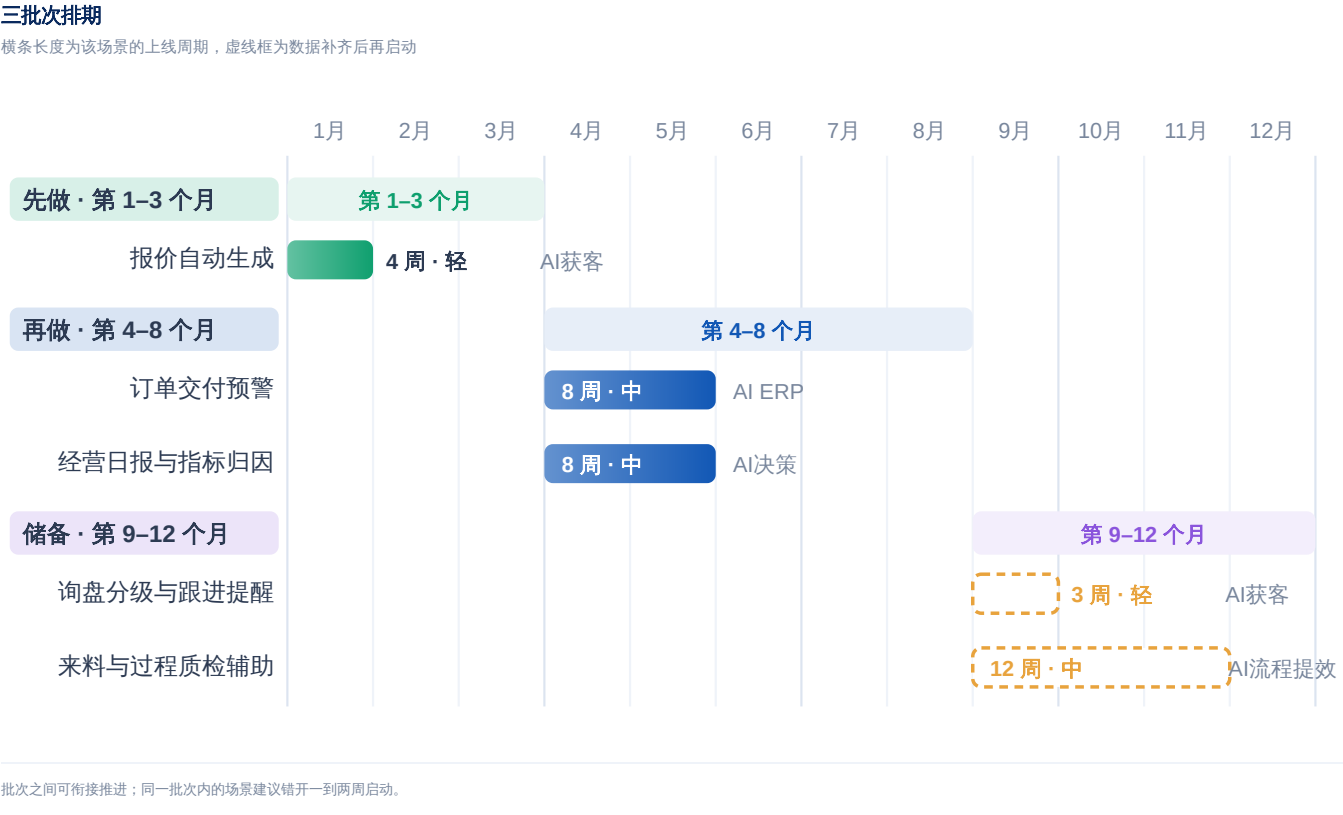

先做 · 第 1-3 个月

一个场景跑通，把做法与数据口径固定下来

场景	周期
No.1 报价自动生成 整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板	4 周

里程碑：第一个场景稳定运行，做法与数据口径固定下来

再做 · 第 4-8 个月

两个场景并行，让改善出现在经营报表上

场景	周期
No.2 订单交付预警 导出近 6 个月订单与实际交付日期，做一次准点率基线	8 周
No.3 经营日报与指标归因 定下 8 个经营指标的口径与取数位置，先做成一页日报	8 周

里程碑：两个场景的改善出现在经营报表上，形成可复制的推进方式

储备 · 第 9-12 个月

条件补齐后启动，或等前两批沉淀出数据后再评估

场景	周期
No.11 询盘分级与跟进提醒 把三个月内的询盘集中到一张表，标注来源、金额与当前状态	3 周
No.12 来料与过程质检辅助 把近一年的不良记录按品类与供应商做一次分布统计	12 周

里程碑：条件补齐的场景进入评估，AI 覆盖到第二条业务线

推进节奏 · CAPACITY

现有人员兼职推进

以单点场景起步，避免同时铺开

14

投入与回报
INVESTMENT

5-20 万元
流程级应用

零投入起步
0 元

用轻享版与内部整理动作起步，两周使用记录即可验证价值。
适合：先要看到效果再谈投入的企业

轻量场景
1-5 万元

单个场景配置上线，配套一次数据整理与一轮培训。
适合：数据基本可得、希望快速见效的企业

流程级应用 ★
5-20 万元

场景嵌入日常作业流程，打通一到两个业务系统的取数。
适合：有系统基础、准备把 AI 变成日常工具的企业

本次建议

平台与私域
20 万元以上

多场景平台化推进，含系统对接、私域部署与陪跑。
适合：多地多组织、数据不出域要求明确的企业

为什么是这一档 · RATIONALE

流程级应用 · 5-20 万元

前两批共 3 个场景中，投入档最高的一档为「流程级应用」（5-20 万元）。按 现有人员兼职推进、期望 6 个月内见效的条件，建议以这一档规划第一年预算。

逐场景投入与收益口径

BY SCENARIO

排名	场景	投入档	区间	上线	收益折算口径
1	报价自动生成	轻	1-5 万元	4 周	按报价响应提速带来的成单率提升折算
2	订单交付预警	中	5-20 万元	8 周	按延期订单减少与催单沟通工时折算
3	经营日报与指标归因	中	5-20 万元	8 周	按管理层决策提前与对数工时下降折算
4	智能排产与插单模拟	重	20 万元以上	16 周	按设备利用率提升与加班工时下降折算
5	售后与技术支持知识库	零	0 元	2 周	按售后响应工时下降与客户满意度折算
6	单件成本还原与毛利看板	中	5-20 万元	10 周	按低毛利订单识别与报价修正带来的毛利提升折算
7	应收账款预警与催收提醒	轻	1-5 万元	4 周	按回款提前天数与资金成本折算
8	工艺经验沉淀与新人带教	轻	1-5 万元	5 周	按培训工时下降与新人产出提前折算

14

三档推进情景
THREE SCENARIOS

3
档可选

保守推进
CONSERVATIVE

只做首批一个场景，跑通后再评估。适合决策层尚未形成共识、先要看见效果的企业。

项目	内容
范围	首批 1 个场景
场景	报价自动生成
投入	轻 档 · 1-5 万元
人力	一名业务骨干每周半天
预期	取预期指标区间的下限
注意	推进最稳，12 个月内 AI 覆盖面有限

中性推进
BALANCED

按三步走的前两批推进，让改善出现在经营报表上。多数同规模企业选择这一档。

项目	内容
范围	前两批 3 个场景
场景	报价自动生成、订单交付预警、经营日报与指标归因
投入	中 档 · 5-20 万元
人力	一名专职 + 各场景一名业务对接人
预期	取预期指标区间的中值
注意	需要在第 4 个月前完成首批验收，否则第二批顺延

积极推进
AGGRESSIVE

三批并行推进，同步补齐缺失数据源。适合已有数字化团队、且决策层已明确投入的企业。

项目	内容
范围	三批 5 个场景 + 数据补齐
场景	报价自动生成、订单交付预警、经营日报与指标归因、询盘分级与跟进提醒、来料与过程质检辅助
投入	中 档 · 5-20 万元
人力	一个小团队，含一名数据对接人
预期	取预期指标区间的上限
注意	同时铺开会分散精力，需要明确的阶段验收节点

金额口径 · SCOPE

本报告给出推进范围与投入区间

三档给的是推进范围与节奏，具体金额、回收期与分月现金流在「企业AI投入ROI测算器」中按贵司人员工资与业务量测算。

相关服务

SERVICES

服务	价格	说明
专家入企 AI 诊断	1980 元 / 1 天	到企业现场走一遍业务流程，确认排序结论与首个场景的落地方案。
AI 智能体平台搭建	另议	按排序结果搭建企业自己的智能体平台，逐个场景上线。
垂直场景智能体开发	另议	针对单个场景做定制开发，含流程梳理、数据对接与验收。
AI 落地陪跑	另议	首个场景上线后的持续跟进，把使用习惯固定下来。

15

风险与前置条件

RISK & PREREQUISITES

1条提示

关键数据源缺失 2 项

中级

缺少MES / 生产系统、CRM，影响 3 个场景。补齐顺序建议按解锁场景数排：MES / 生产系统（3 个）、CRM（1 个）。

前置条件汇总

PREREQUISITES

场景	前置条件
1. 报价自动生成	材料价格表需要有人定期维护
2. 订单交付预警	工序进度需要每日回填，纸质流转卡先做电子化
3. 经营日报与指标归因	指标口径需要各部门确认一次，存在分歧的先统一定义
4. 智能排产与插单模拟	标准工时需要重新测定，缺失工时的工序先按经验值补齐
5. 售后与技术支持知识库	图纸与参数表需要统一版本，过期资料先做清理

角色分工

WHO DOES WHAT

角色	由谁担任	投入
牵头人 定目标与验收标准、协调跨部门、每月看一次进展	企业负责人或分管副总	每月 2 小时
业务对接人 提供业务规则、参与试运行、反馈使用问题	销售内勤与报价工程师（首批场景）	上线期每周半天
数据对接人 导出所需数据、确认字段口径、处理系统对接	IT 或熟悉业务系统的人员（现有 1-2 人）	起步阶段集中 3-5 天

16

90 天启动清单
FIRST 90 DAYS

9
项执行动作

✓	时间	要做的事	类型	负责人	对应场景
☐	第 1-2 周	整理近两年成交报价单，按产品族归类出可复用的报价模板	起步	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 1-2 周	把所需数据清单交给对应岗位：历史报价与成交记录	数据	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 3-4 周	材料价格表需要有人定期维护	前置	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 3-4 周	整理材料价格表与工时与费率标准，确认口径一致	数据	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 5-8 周	在「AI获客」里配置该场景并试运行两周	上线	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 5-8 周	记录使用前后的对比：报价响应从 2 天缩短到 4 小时内	验收	销售内勤与报价工程师	报价自动生成
☐	第 9-12 周	导出近 6 个月订单与实际交付日期，做一次准点率基线	准备	生产计划员与业务经理	订单交付预警
☐	第 9-12 周	定下 8 个经营指标的口径与取数位置，先做成一页日报	准备	总经理与各部门负责人	经营日报与指标归因
☐	第 9-12 周	评估补齐「MES / 生产系统」，它关系到 3 个场景	数据	数字化负责人	数据补齐

验收 · ACCEPTANCE

报价自动生成

报价响应从 2 天缩短到 4 小时内。试运行两周后对比使用前后的数据，确认后再推第二批。

- 推进节奏建议
- CADENCE
- 每周固定半天，由业务对接人牵头推进，避免被日常事务挤掉。
 - 每月一次复盘，牵头人看一次进展与指标变化，决定是否进入下一批。
 - 同时只推一个场景，首批跑通之后再并行，避免进度都停在半途。

17

未入选与复盘
NOT THIS ROUND

5
个场景本轮暂缓

排名	场景	总分	对应模块	未入选原因
9	库存与安全库存预警	60.5	AI ERP	与本次勾选的痛点关联较弱，痛点强度 1 / 5
10	能耗与班次消耗分析	53.5	AI决策	与本次勾选的痛点关联较弱，痛点强度 1 / 5
11	询盘分级与跟进提醒	43.5	AI获客	关键数据源缺失：CRM，补齐后重新评估
12	来料与过程质检辅助	29.5	AI流程提效	关键数据源缺失：MES / 生产系统，补齐后重新评估
13	设备预测性维护	24.0	AI ERP	关键数据源缺失：MES / 生产系统，补齐后重新评估

什么时候值得重新跑一次排序

WHEN TO RE-RUN

补齐了一个业务系统

该系统相关场景的数据可得分会从 1 分回到可评估区间，排序会明显变化

本次缺 MES / 生产系统、CRM，其中「MES / 生产系统」影响 3 个场景。

首批场景上线并稳定运行

团队有了经验，实施门槛下降；同时沉淀出的数据会让后续场景的数据可得分提高

首批为「报价自动生成」，约 4 周。

经营重点发生变化

痛点勾选与半年目标变了，痛点强度这一维（占 35%）会重新分配

人员规模或业务线发生较大变化

可投入人力与适用场景都会变，建议重新填一次画像

距上次排序超过 6 个月

场景库会持续补充，同类企业的落地经验也在更新

A

全部场景评分明细
SCORING DETAIL

13
个候选场景

排名	场景	环节	痛	数	效	槛	加权贡献	总分	模块
1	报价自动生成	销售前端	4	5	5	2.5	28.0 + 30.0 + 20.0 + 10.5	88.5	AI获客
2	订单交付预警	生产计划	4	5	4	3.5	28.0 + 30.0 + 16.0 + 7.5	81.5	AI ERP
3	经营日报与指标归因	经营管理	3	5	4	3.5	21.0 + 30.0 + 16.0 + 7.5	74.5	AI决策
4	智能排产与插单模拟	生产计划	5	4	3	5	35.0 + 24.0 + 12.0 + 3.0	74.0	AI ERP
5	售后与技术支持知识库	售后服务	1	5	5	1.5	7.0 + 30.0 + 20.0 + 13.5	70.5	AI流程提效
6	单件成本还原与毛利看板	成本核算	3	5	3	4.5	21.0 + 30.0 + 12.0 + 4.5	67.5	AI CFO
7	应收账款预警与催收提醒	财务管理	1	5	5	2.5	7.0 + 30.0 + 20.0 + 10.5	67.5	AI CFO
8	工艺经验沉淀与新人带教	人员培养	1	5	4	2.5	7.0 + 30.0 + 16.0 + 10.5	63.5	AI人力官
9	库存与安全库存预警	仓储物料	1	5	4	3.5	7.0 + 30.0 + 16.0 + 7.5	60.5	AI ERP
10	能耗与班次消耗分析	成本管理	1	5	3	4.5	7.0 + 30.0 + 12.0 + 4.5	53.5	AI决策
11	询盘分级与跟进提醒	销售前端	1	1	5	2.5	7.0 + 6.0 + 20.0 + 10.5	43.5	AI获客
12	来料与过程质检辅助	质量管理	1	1	3	4.5	7.0 + 6.0 + 12.0 + 4.5	29.5	AI流程提效
13	设备预测性维护	设备管理	1	1	2	5	7.0 + 6.0 + 8.0 + 3.0	24.0	AI ERP

加权贡献顺序：痛点强度 + 数据可得 + 见效周期 + 实施门槛；门槛项按（6 - 门槛）× 权重计。

B

方法、术语与信息来源

METHOD & SOURCES

术语

GLOSSARY

术语	说明
痛点强度	场景解决的问题与您勾选痛点的吻合程度，按严重程度加权，1-5 分。
数据可得	落地这个场景所需的数据现在能否拿到，由现有业务系统决定，1-5 分。
见效周期	从开始做到看见结果所需时间，分数越高见效越快。
实施门槛	落地需要改动的流程、系统与人员范围，分数越高门槛越高，计时时取反。
条件不具备	场景本身价值高，但关键数据源缺失，补齐后重新评估即可进入候选。
投入档	零 / 轻 / 中 / 重 四档，对应 0 元 / 1-5 万 / 5-20 万 / 20 万以上。

信息来源与置信度

SOURCE & CONFIDENCE

内容	来源	置信度
企业画像 13 项	本次填写	填报
痛点与严重程度	本次勾选与打分	填报
现有业务系统	本次填写	填报
见效速度与实施门槛	场景库预设值	经验估算
预期指标区间	同类企业落地经验	经验估算
投入区间	同类项目常见报价	经验估算
四维得分与排序	按公式计算	可复算

计分口径与适用边界

SCOPE

- 评分公式：**总分 = 痛点强度 × 权重 + 数据可得 × 权重 + 见效周期 × 权重 + (6 - 实施门槛) × 权重。四维各 1-5 分，权重默认按标准口径取 0.35 / 0.30 / 0.20 / 0.15，总分换算为百分制。
- 痛点强度：**痛点强度由您勾选的痛点与场景标签的匹配情况，以及您给出的严重程度共同决定。
- 数据可得：**数据可得由您现有的业务系统与场景所需数据源比对得出。关键数据源缺失时计 1 分，这会让排序随企业现状明显变化。
- 场景库来源：**场景库按行业大类整理，每个大类 13 个场景，覆盖该大类下的各细分行业。场景的见效速度、实施门槛、投入档位为场景库预设值，由服务过的同类企业落地经验归纳而来。
- 适用边界：**本报告给出的是排序与起步路径。具体投入金额、回收期与分月现金流，在「企业AI投入ROI测算器」中按您的人员与工资口径测算。

复算方式 · REPRODUCIBLE

同样的输入会得到同样的排序

四维得分与总分为确定性计算，调整权重、补充系统或修改痛点严重程度后重新提交，即可看到排序变化。



顶呱呱集团 · 薯片AI智能体

平台 platform.dgg.cn 展位号 6A-B034-B035

杭州市拱墅区文晖街道 兴和元洲园区 2 号楼 5 楼

联系电话 13735822136

服务城市 北京 深圳 广州 杭州 郑州 上海 武汉 成都 重庆 长沙 宜昌 佛山 东莞 香港



排序给出的是起步顺序。先把第一个场景跑通，数据与做法沉淀下来之后，后面的场景会比现在更容易落地。
